



工程概要

工程名稱：SL-105標花蓮站改建工程

主辦機關：交通部鐵路改建工程局東部工程處

設計及監造：台灣世曦工程顧問股份有限公司

施工廠商：榮金營造工程股份有限公司

契約金額：新台幣6.89億元


工期：1170日曆天

實際開工：103年6月12日

預定完工：106年8月24日



施工現況平面

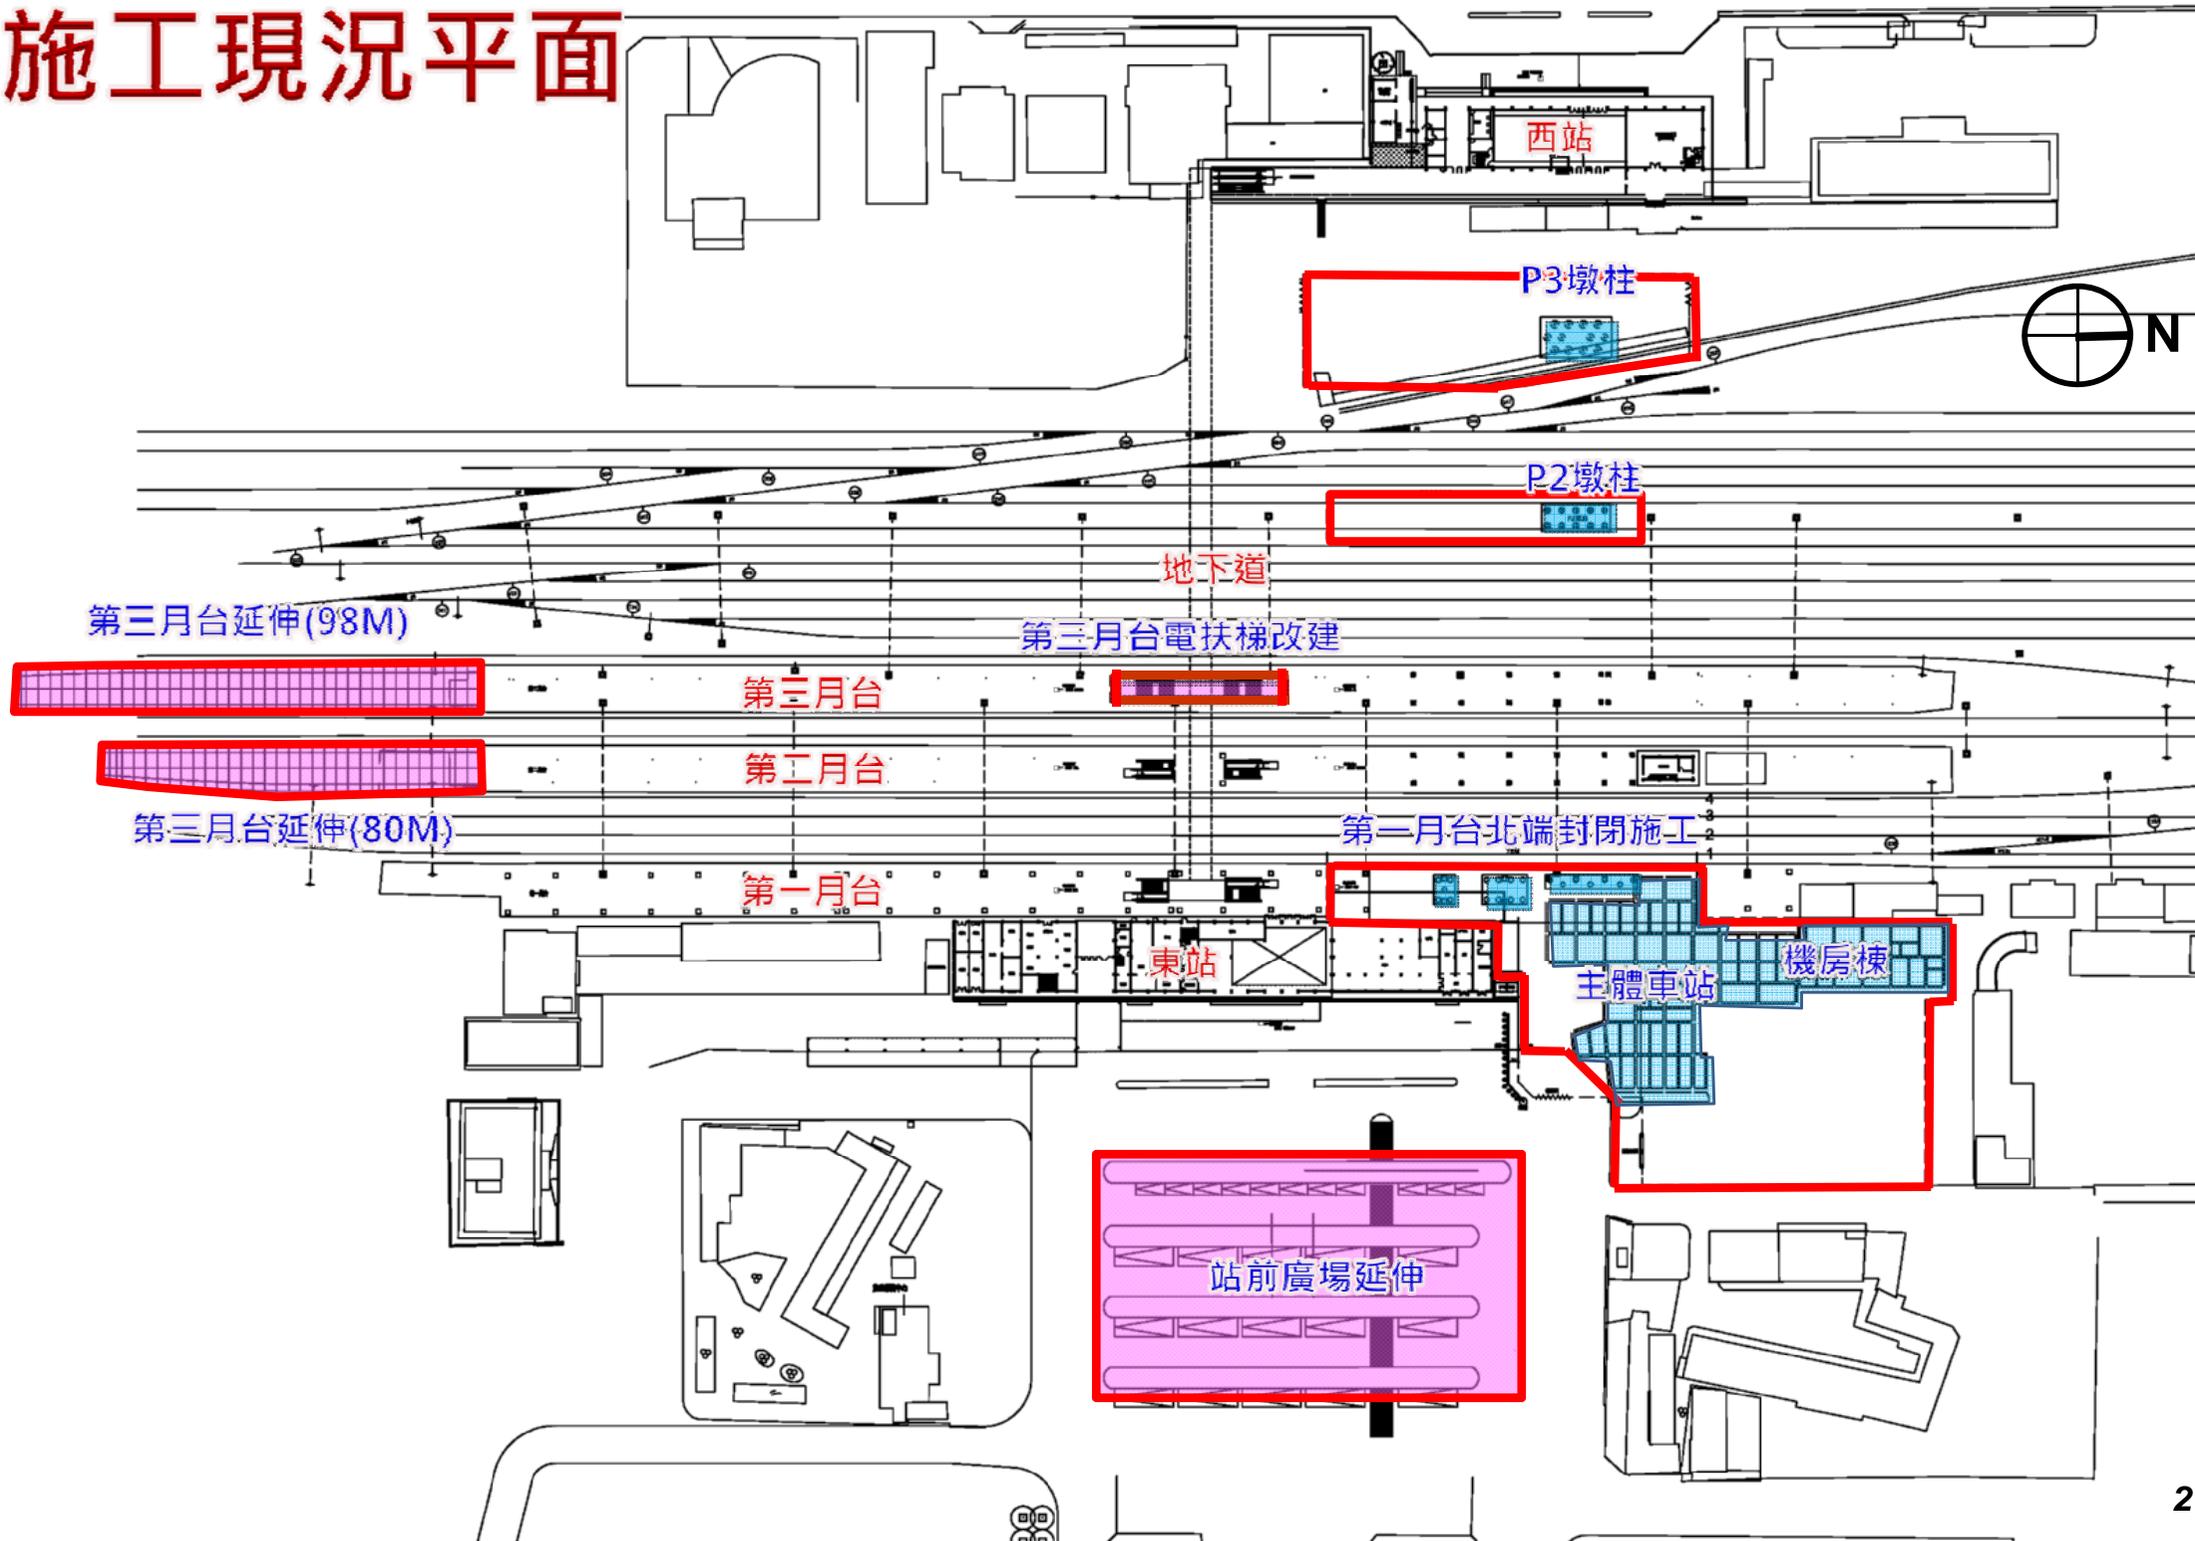

施工照片



自由通道月台段-
第一月台主體車站施工



主體車站Cy1~Cy6、
Cx7~Cx10FS版施工



主體車站機房棟-B1F水箱施
工



第二、三月台南端延伸施工




自由通道橋梁段-
P2墩柱帽梁結構施工



自由通道橋梁段-
P3墩柱帽梁結構施工

第三月台-電扶梯改建

施工期間第三月台現況:

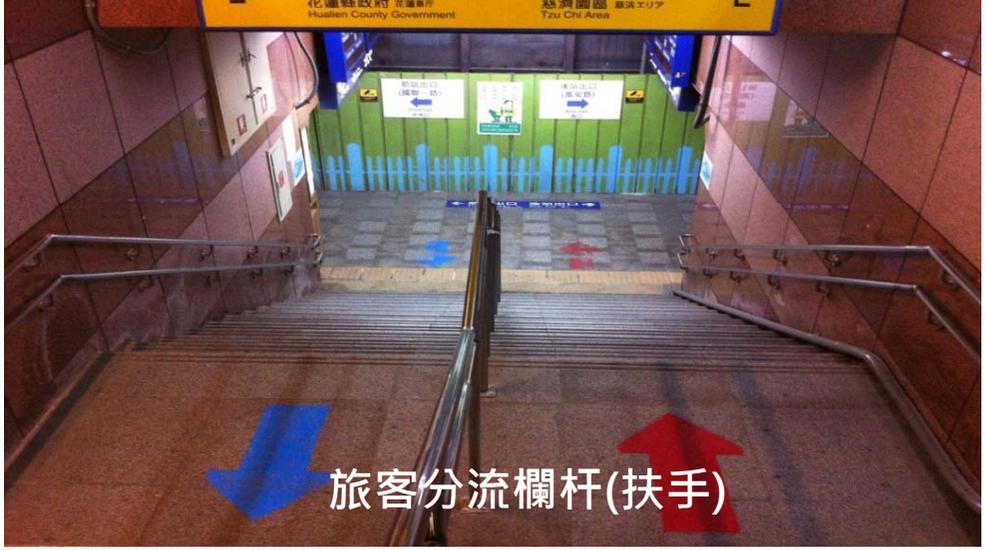

近期施工期程

- 一、第三月台電扶梯改建，南側預定104年8月13完成，北側預定105年1月30日完成。
- 二、第二、三臨時月台延伸預訂104年7月15日完成結構施工。
